

Bilan hebdomadaire Qualité Entrée d'Air NEO

Semaine 23


QQ: Questionnaire de Qualification
IQ: Industrial Qualification (Document officiel)
TU: Statut « Urgent »
TA: Statut « Temporary Assessment »
Q: Statut « Qualified »
C: Statut « Cancelled »

Sébastien EMERIAU
Qualité SAIL
Pour le compte de DAHER-SOCATA
Sous-traitant de AIRBUS NANTES

Phone : +33 (0)2 51 19 60 01
sebastien.emeriau.external@airbus.com


Planning des activités

2013-2014

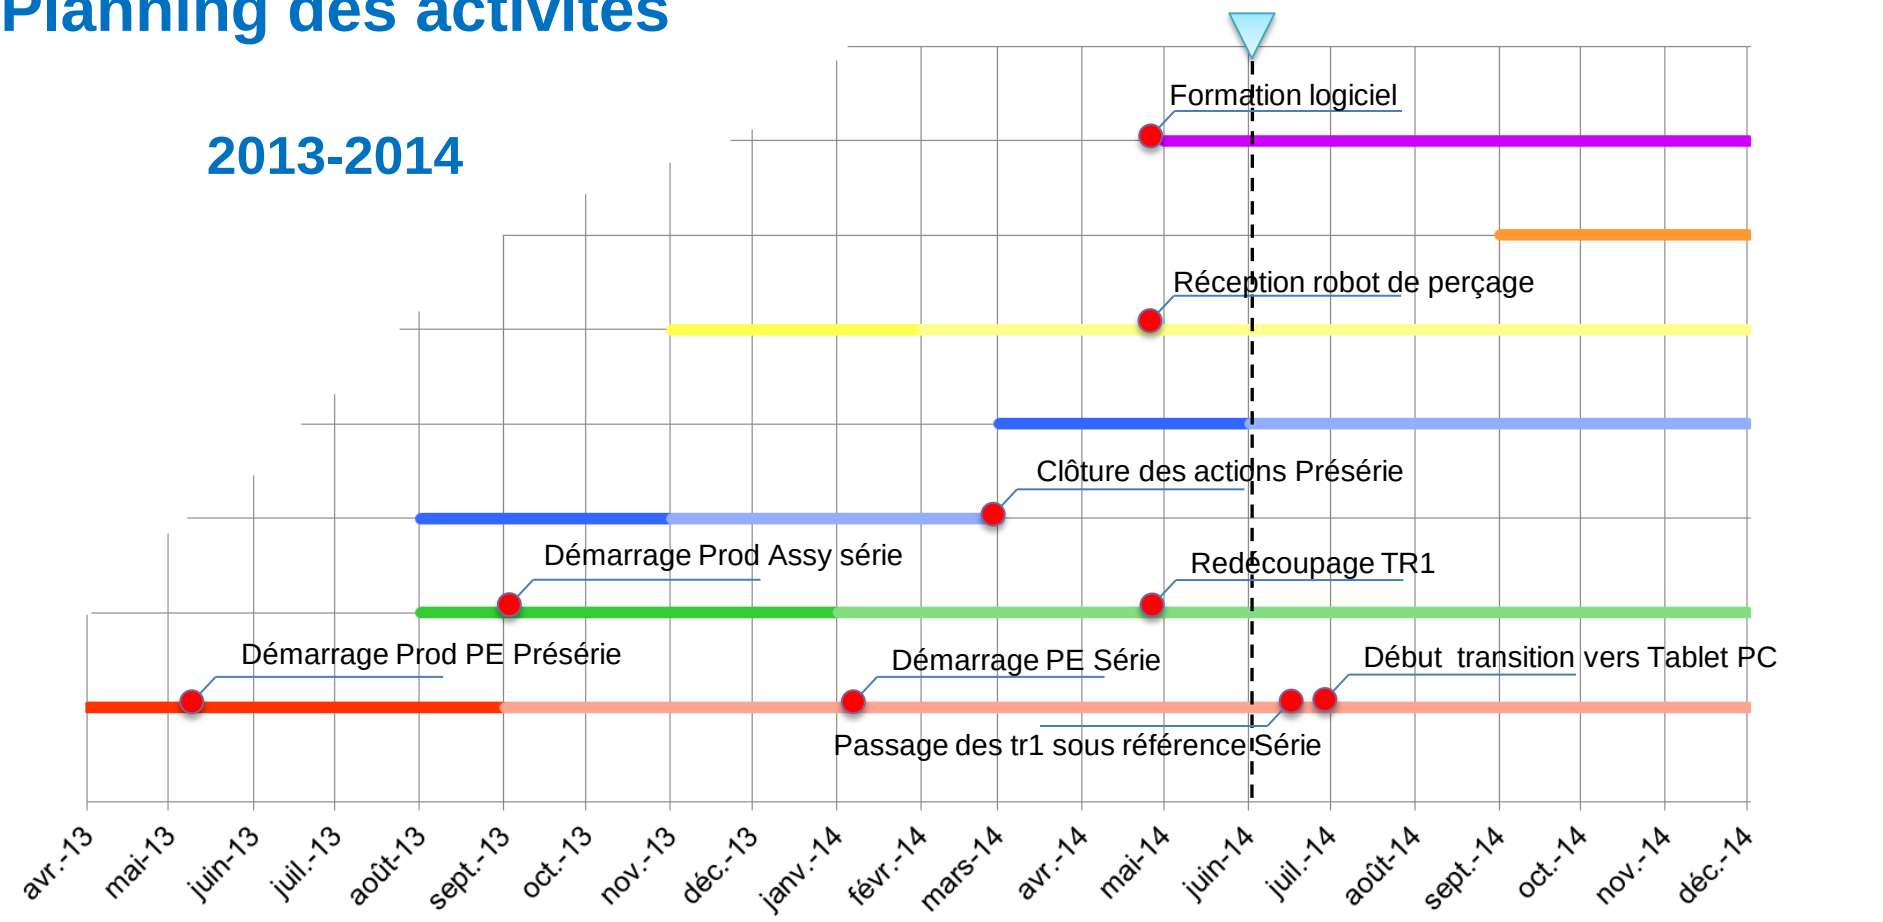


	<i>Création/ rédaction</i>	<i>Activité de Suivi</i>	<i>Commentaires</i>
TR1 Tablet PC			Démarrage Planifié en Mai, formation effectuée
Gammes de Surv.			Planifiées 4eme trimèstre 2014
Qualifs Assy			Suivi du Plan d'action en cours
Qualifs PE			Qualifications Série en cours
TR1 Assy			TR1 Rédigés, Update pour FT
TR1 PE			TR1 Rédigés, Mises à jour en fonction des nouveaux moyens


Qualifications Pièces Élémentaires

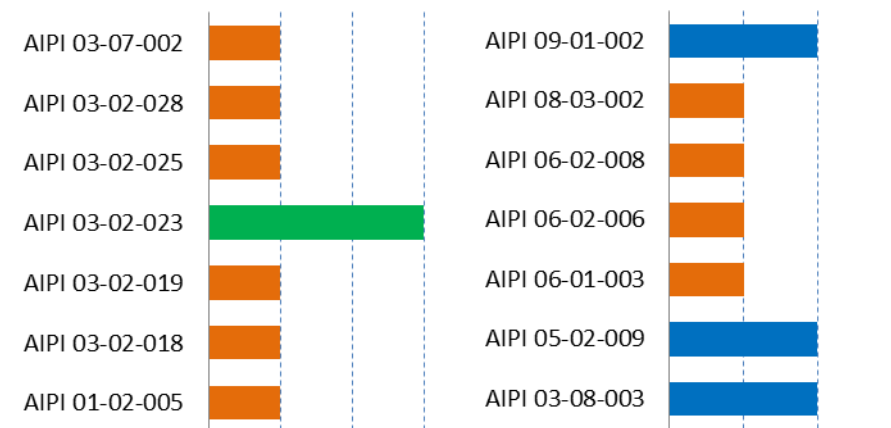

Légende	Commentaire
Statut TU	10 Procédé échéance Juillet 2014
Statut TA	3 Statut avec Echéance Novembre 201
Statut Q	1 statut Q en surveillance

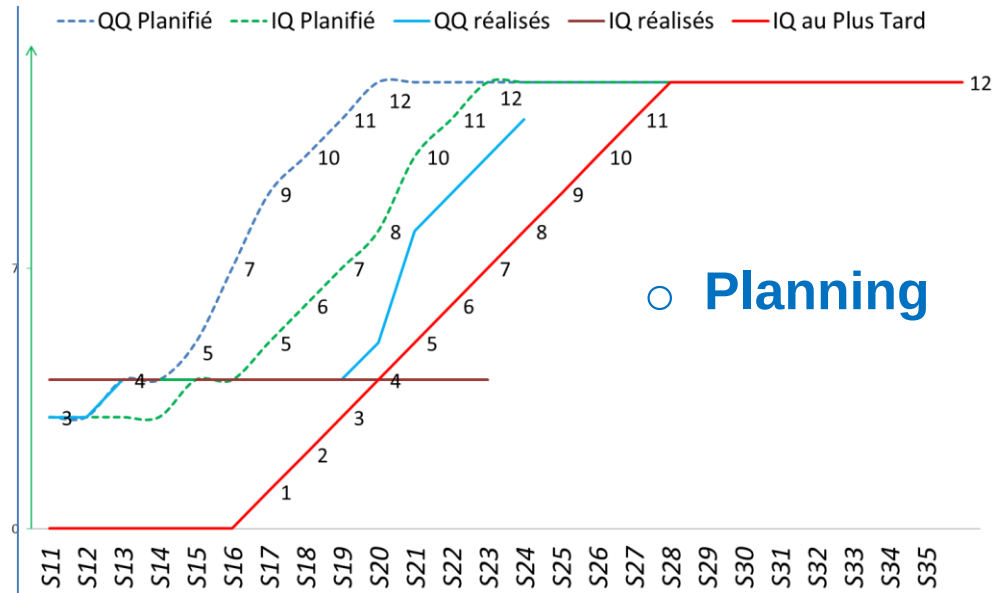

○ Suivi des Actions (actions restantes préséries)

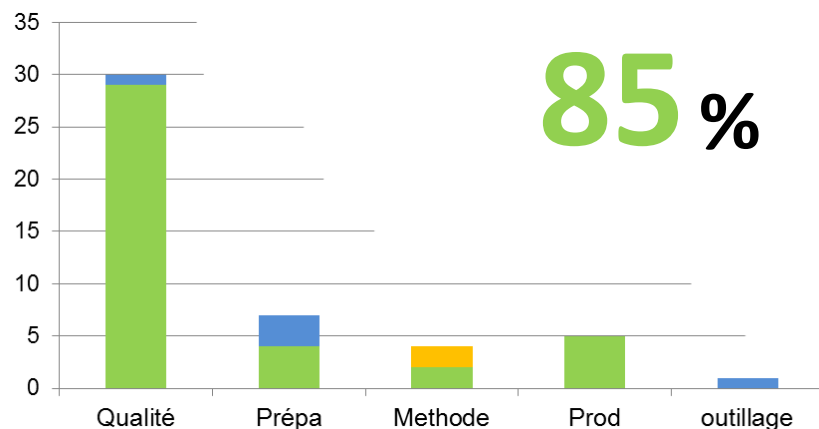

Légende	Comentaires
En cours	Actions restantes PE
En retard	MAJ doc CMR + MPSL
Réalisés	/

○ Points Bloquants/Retards:

- MAJ MPSL et CMR
- Validation AIPI Bobinage, Dépose Bande



○ Faits Marquants

- Rédaction des IPA
 - 03-02-018
 - 03-02-019
 - 06-02-008
 - 03-02-028
 - 09-01-002


○ Objectif Semaine 24

- Passage TA 5 AIPI
- Rédaction IPA
 - 06-01-003
 - 06-02-006

Qualifications Assemblage

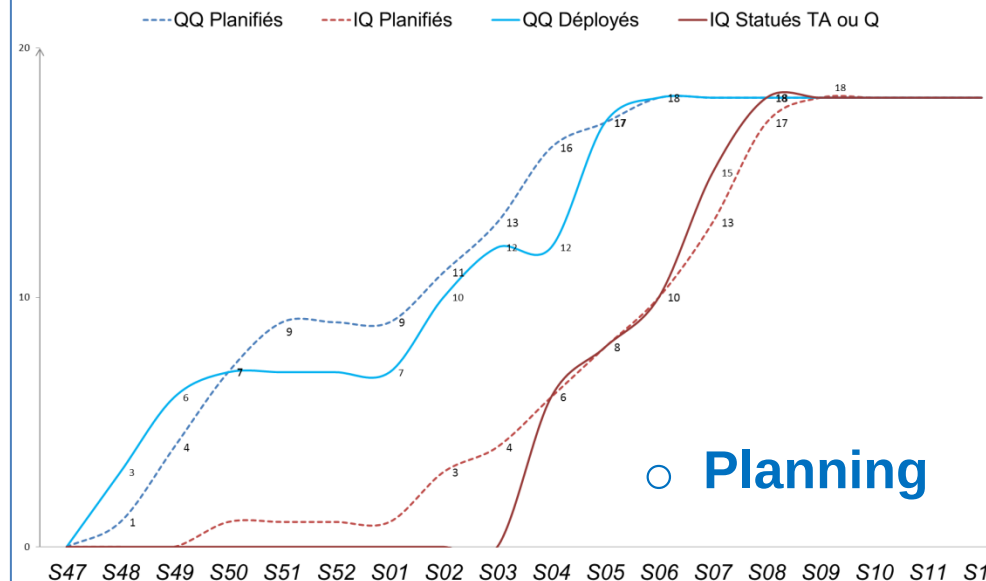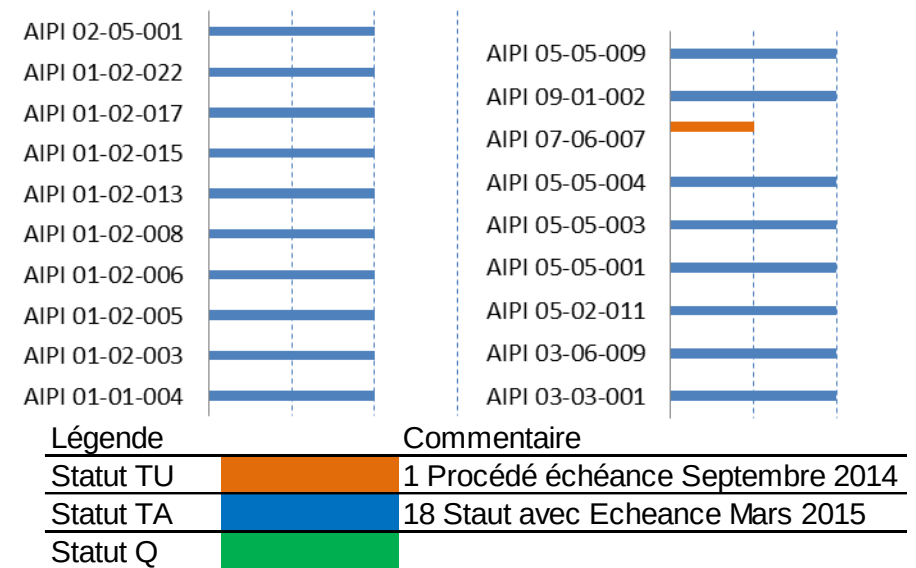

○ Suivi des Actions

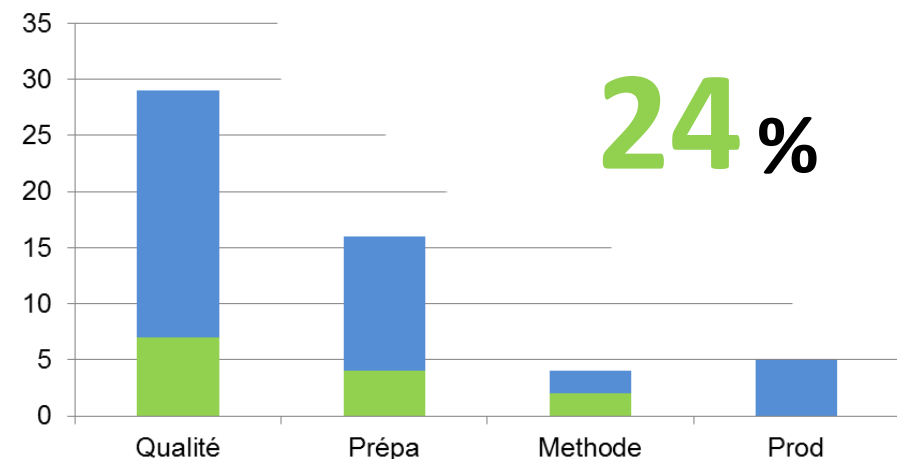

Légende	Comentaires
En cours	Actions Suivis en Réunions Mensuel
En retard	/
Réalisés	/

○ Points Bloquants/Retards:

- Modifications importantes des Plans
- Eprouvettes Alodines
- Rondelle sous écrou (eclisses de bride)


○ Faits Marquants

- Préparation des TR1 et de l'Appro
- Eprouvettes Alodines

Objectif Semaine 24

- Revue des Actions qualifs

TR1 Pièce élémentaire

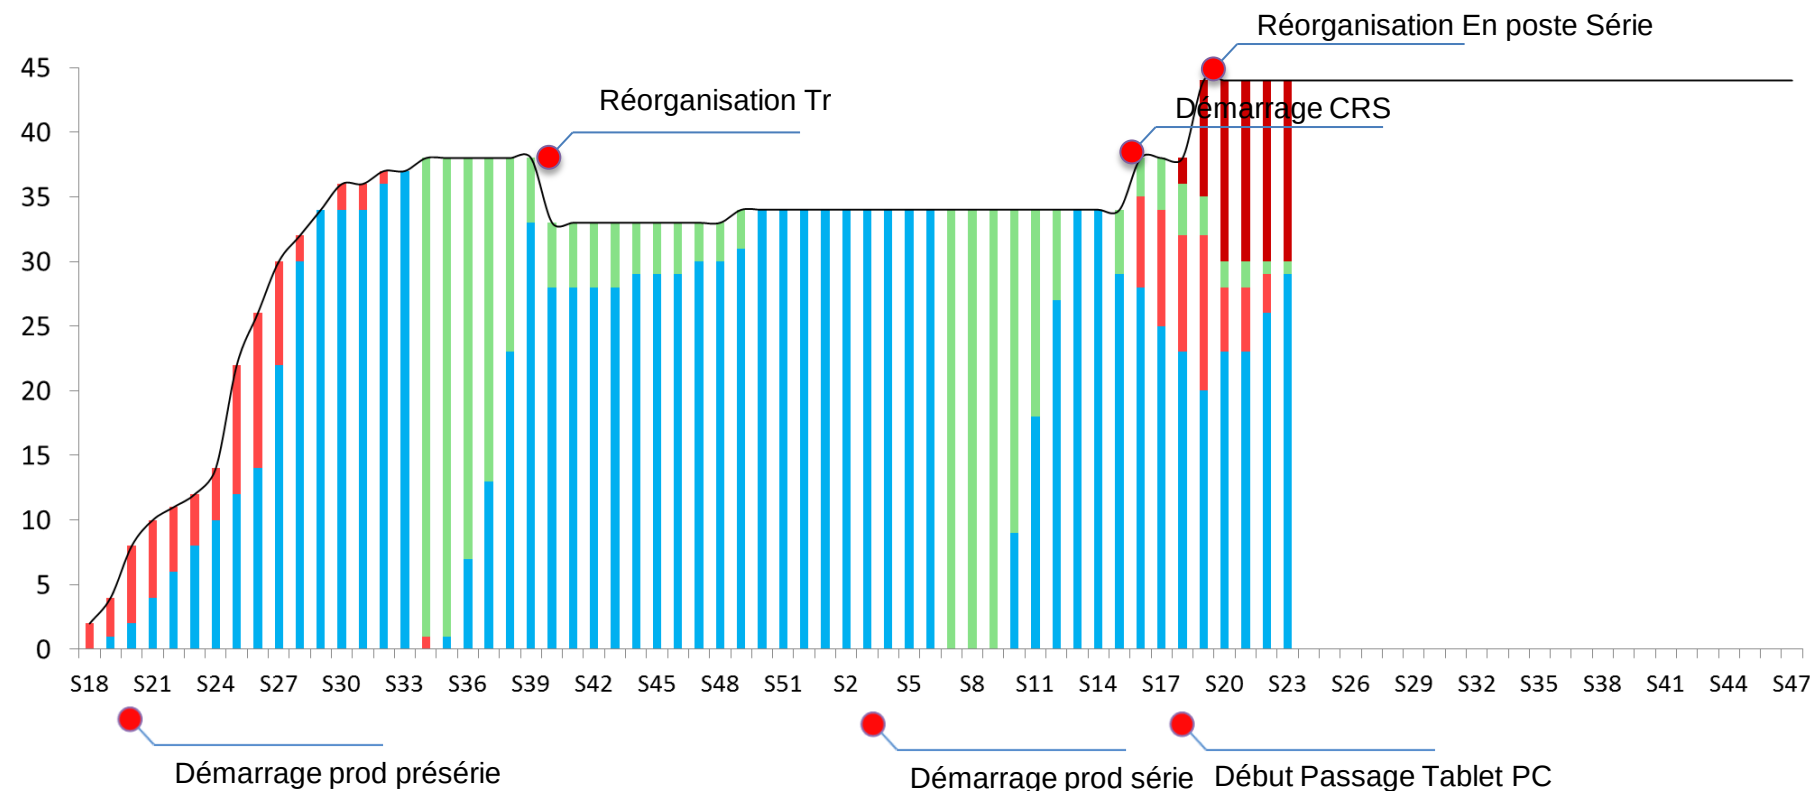


Légende	TR1 Papier	TR1 Tablet PC	Commentaires
TR1 en Création			Paramétrage de 14 TR1 Informatisé
TR1 en Modification			Update des TR Inspection Couche résistive
TR1 Validés			A remplacer progressivement par TR1 Tablet PC

Réalisation d'un TR Spécifique pour Essais de peinture au rouleau (EMI)

○ Points Bloquants/Retards:

- Pbs de fonctionnement du paramétrage des fonctions de calculs dans les TR

TR1 Assemblage

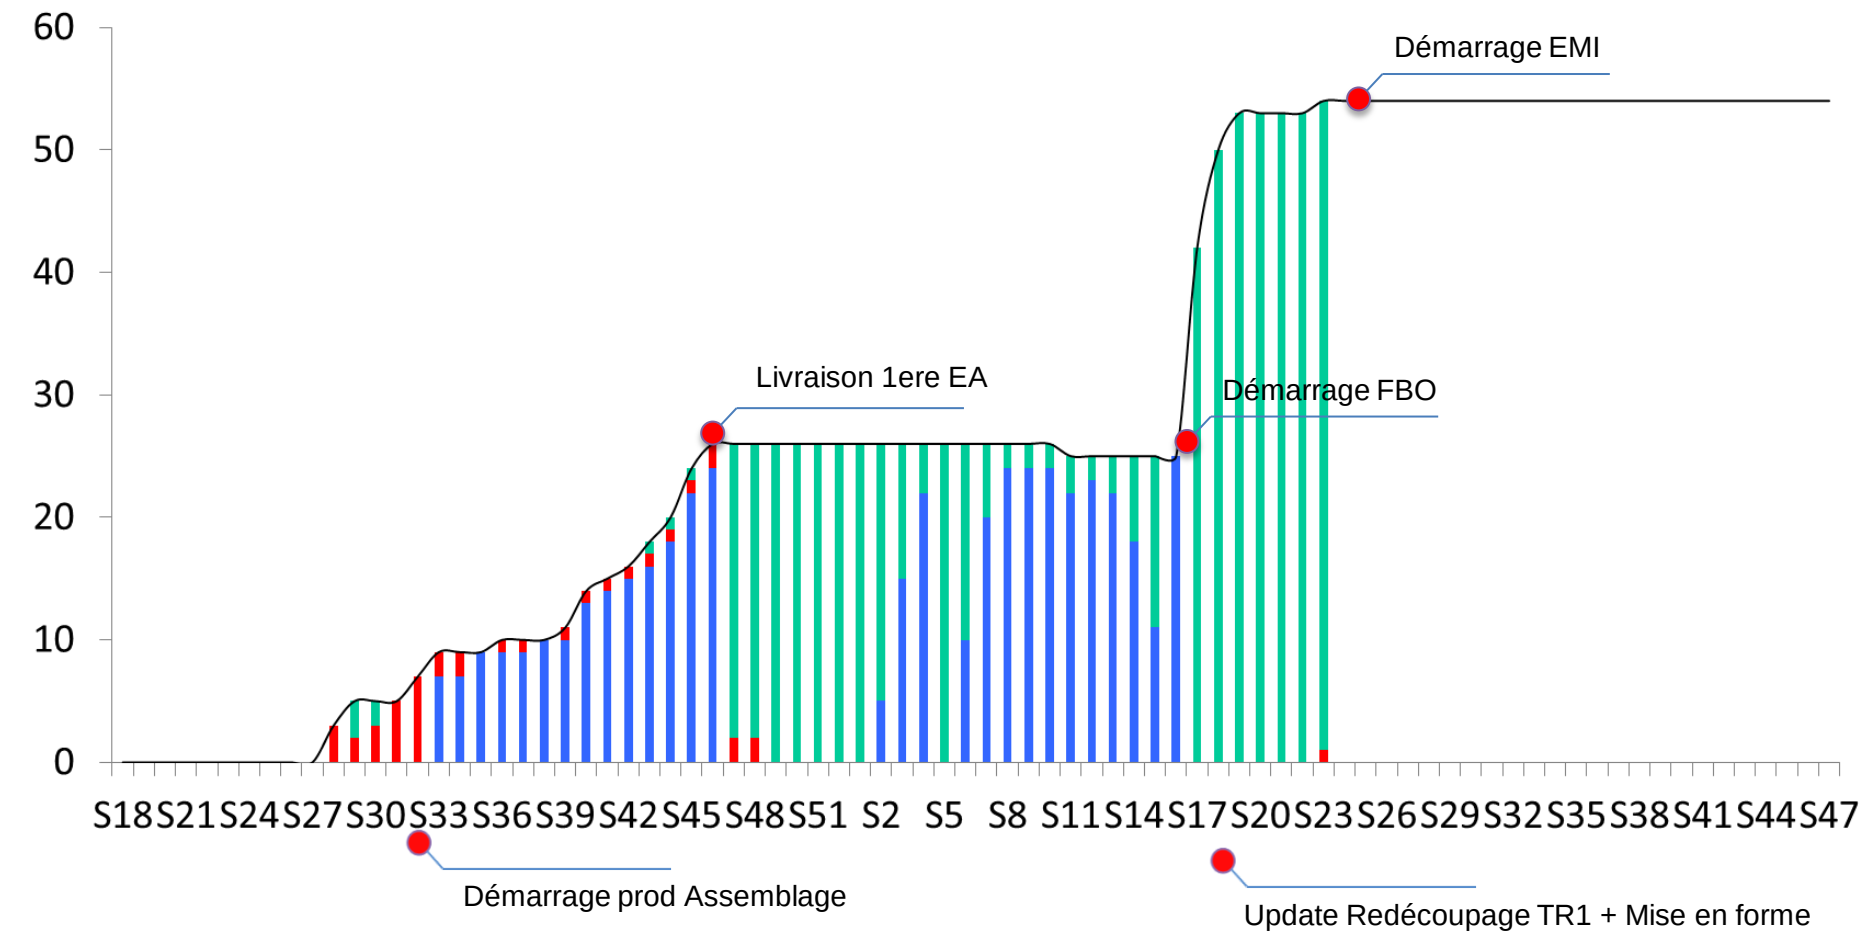

Légende

		Commentaires
TR1 en Création		Création TR1 Alodine 1200+ peinture
TR1 en Modification		Update: Redécoupage + Mise sous SAP PEA
TR1 Validés		TR1 a valider Pour EMI

Points Bloquants/Retards:

- Passage de PGI vers PEA : indisponibilité du format « Type 190 »

Données Sources

- [Lien vers les Indicateurs TR1](#)
 - Planning Général
 - Evolutions TR1 assemblage
 - Evolutions TR1 PE
- [Fichier de suivi des modifications TR1 Et liste TR1 assemblage](#)
 - Historique des demandes de modifications
 - Liste des tr1 Assemblage par Spare
- [Lien vers Relevés U-Wave](#)
- [Lien vers Liste TR1 PE](#)
 - Suivi du passage vers les TR1 Tablet PC
- [Fichier de suivi des gammes PE](#)
 - Liste des TR1 PE attachés aux gammes PE
- [Lien vers les Indicateurs Qualifications](#)
 - Planning des qualifications
 - Suivi des IPA
- [Lien vers Plan d'action Qualifications](#)
 - Plan d'action
 - Pareto des Actions par Service
- [Lien vers les Bilans hebdo précédents](#)
